# 产品 HUBBLE 项目计划跟踪报告

>>> 报告生成日期【Tue May 29 13:11:53 2018】 <<<

## 项目基本信息

项目名称: 电科华云大数据服务平台 Hubble V2.0

项目编号: PRD-2018-PROJ-00001

项目负责人:饶定远

项目起止日期: 2018年3月19日至 2018年7月17日

项目预算(工时成本):211.2万元

项目功能简介: 1. 数据连接管理, 2. 结构化数据汇聚, 3. 数据清洗转换, 4. 非结构化数据汇聚, 5. 仪表盘, 6. 作业监控, 7. 系统健康监控, 8. 数据源管理, 9. 数据查看, 10. 结构变更历史查看, 11. 标签管理, 12. 业务字典, 13. 数据资源集合, 14. 数据地图

里程碑: V2.0 里程碑#5 18, 从 2018-03-26 到 2018-05-18

当前阶段: 20180521-20180603, 从 2018-05-21 至 2018-06-04

## 情况总览

项目共有 9 个 EPIC 被分解到 106 个功能点的 286 个任务上。

目前已完成 66 个功能点 (完成率 62.26%) 和 257 个任务 (完成率 89.86%)。

## 本里程碑的基本情况

本阶段共有 41 个功能点,已完成 33 个,完成率 80.00%,明细如下:

| 功能名称                | 状态 | 功能名称   | 状态 |
|---------------------|----|--|----|
| Hubble V2.0 第二轮转测支持 | 完成 | spark 増加通过 jdbc 访问 oracle、mysql 和 gp<br>数据检查支持 | 待办 |
| 重复数据检测插件包的开发        | 完成 | Hubble V2.0 项目转测支持                             | 完成 |
| 集成环境验证及 bug 修复      | 完成 | 测试 case 的 review 工作                            | 完成 |

| 数据质量规则管理                   | 完成  | 自动化部署                 | 完成  |
|----------------------------|-----|-----------------------|-----|
| 成都公安项目使用数据质量进行二次开发知识<br>转移 | 处理中 | 删除数据质量规则              | 完成  |
| 编辑数据质量规则详情                 | 完成  | 查看数据质量规则详情            | 完成  |
| 查看数据质量规则列表                 | 完成  | 创建数据质量检测规则            | 完成  |
| 删除数据质量报告                   | 完成  | 编辑数据质量报告              | 完成  |
| 查看数据质量报告                   | 完成  | 查看数据质量报告列表            | 完成  |
| 创建数据质量报告                   | 完成  | 删除数据质量任务              | 完成  |
| 停止数据质量任务                   | 完成  | 编辑数据质量检测任务            | 完成  |
| 启动数据质量任务                   | 完成  | 查看数据质量检测任务详情          | 完成  |
| 查看数据质量检测任务列表               | 完成  | 新增数据质量检测任务            | 完成  |
| 嘉兴项目 Hubble 环境升级           | 待办  | 通过数据服务实例查询数据          | 完成  |
| 查询数据 API 日志                | 完成  | 同步数据服务实例状态            | 完成  |
| 删除数据服务                     | 待办  | 回收数据服务实例              | 待办  |
| 添加数据服务实例                   | 完成  | 添加数据服务                | 待办  |
| 数据源管理设计优化方案讨论              | 完成  | jenkins上 CI/CD 单元测试搭建 | 处理中 |
| 创建任务时,可以按标签查看及选择列表         | 完成  | 数据源管理优化修改 story       | 完成  |
| 调研大数据平台组件接入                | 待办  | 正则表达式校验规则             | 完成  |

## 个人数据统计

本阶段执行过程中研发团队个人(共13人)综合情况如下:

|           | 完成率    | 消耗率     | 贡献率    | 质量系数  |
|-----------|--------|---------|--------|-------|
| 秦立义       | 100.00 | 101.10  | 8. 07  | 1. 35 |
| 何坤峰       | 100.00 | 87. 99  | 11. 33 | 0. 47 |
| 官玖伟       | 90.70  | 100.00  | 10. 50 | 0. 29 |
| <b>靳翼</b> | 90. 59 | 99. 61  | 7. 54  | 0. 22 |
| 程瑜        | 100.00 | 89. 04  | 4. 32  | 4. 32 |
| 郑镖        | 95. 79 | 107. 89 | 11. 24 | 0.66  |
| 邱实        | 94. 80 | 71. 68  | 10. 23 | 0.85  |
| 杨开睿       | 87. 38 | 88. 12  | 11.95  | 0. 33 |
| 雷东东       | 89. 29 | 125.00  | 1.66   | 0.83  |
| 陈燕秋       | 91.30  | 112. 81 | 12. 93 | 0. 37 |
| 李诗        | 100.00 | 75. 36  | 4.08   | 0.41  |

【说明】: 1)任务完成率:完成任务量的占比;2)消耗率:已消耗工时的占比;3) 贡献率:承接任务量的占比;4)质量系数:贡献率/返工数。


## 非计划类事务情况

本阶段执行过程中插入了以下"外来"的事务:

- 1) HUBBLE-2080: 整理 kettle 调研结论文档, 预估投入成本1(工时)
- 2) HUBBLE-1262: 【四川公安警综】项目支持, 预估投入成本 24(工时)
- 3) HUBBLE-1219: 【三峡博物馆】项目支持,预估投入成本1(工时)
- 4) HUBBLE-1198: 【嘉兴智慧城市】项目支持,预估投入成本2(工时)
- 5) HUBBLE-1197: 【三峡博物馆】项目支持, 预估投入成本 5 (工时)
- 6) HUBBLE-922: 【深圳智慧院】项目支持, 预估投入成本 8 (工时)
- 7) HUBBLE-779: 【深圳智慧院】升级方案讨论, 预估投入成本 1 (工时)
- 8) HUBBLE-770: 【数据血缘】支持项目开发,预估投入成本2(工时)
- 9) HUBBLE-766: 【嘉兴智慧城市】升级方案整理, 预估投入成本 5 (工时)
- 10) HUBBLE-671: 处理警综 hubble 环境恢复, 预估投入成本 2(工时)
- 11) HUBBLE-543: 深圳智慧院 Hubble+CDH 环境恢复, 预估投入成本 4(工时)
- 12) HUBBLE-2191: 甘孜项目支持, 预估投入成本 2(工时)
- 计划外事务的总投入(估算) 59 个工时。

# 过程情况

#### 1) 单元测试情况:

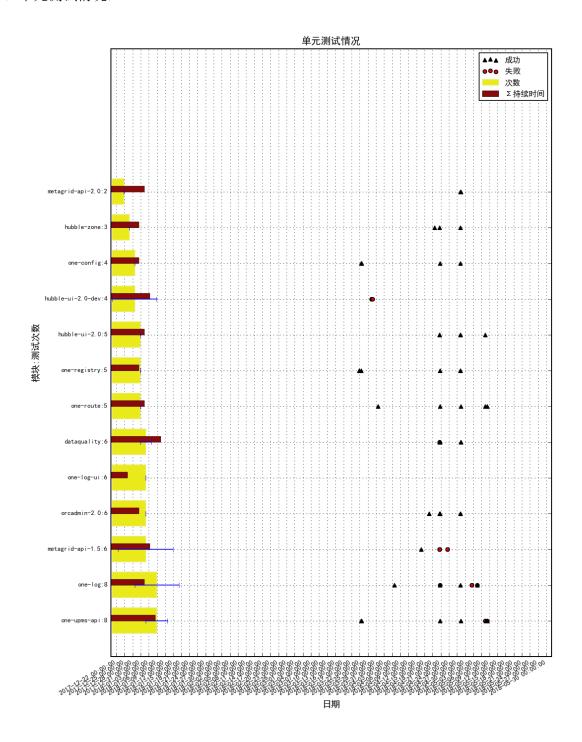

【图例说明】:数据采自 Jenkins 系统,以展示项目中每个模块的单元测试情况。

## 按出错率排序(前十名):

| 模块名              | 测试次数 | 出错率%   |
|------------------|------|--------|
| metagrid-api-1.5 | 6    | 83. 33 |
| one-log          | 8    | 50.00  |
| one-upms-api     | 8    | 25. 00 |
| dataquality      | 6    | 16. 67 |
| orcadmin-2.0     | 6    | 0.00   |
| one-log-ui       | 6    | 0.00   |

## 按测试次数排序(前十名):

| 模块名              | 测试次数 | 出错率%   |
|------------------|------|--------|
| one-upms-api     | 8    | 25. 00 |
| one-log          | 8    | 50.00  |
| metagrid-api-1.5 | 6    | 83. 33 |
| orcadmin-2.0     | 6    | 0.00   |
| one-log-ui       | 6    | 0.00   |
| dataquality      | 6    | 16. 67 |

### 按稳定性排序(前十名):


| 模块名              | 测试次数 | 出错率%   |
|------------------|------|--------|
| orcadmin-2.0     | 6    | 0.00   |
| one-log-ui       | 6    | 0.00   |
| one-upms-api     | 8    | 25. 00 |
| dataquality      | 6    | 16. 67 |
| one-log          | 8    | 50.00  |
| metagrid-api-1.5 | 6    | 83. 33 |

2) 单元测试覆盖率:

无。

# 计划跟踪


## 一、活动分布

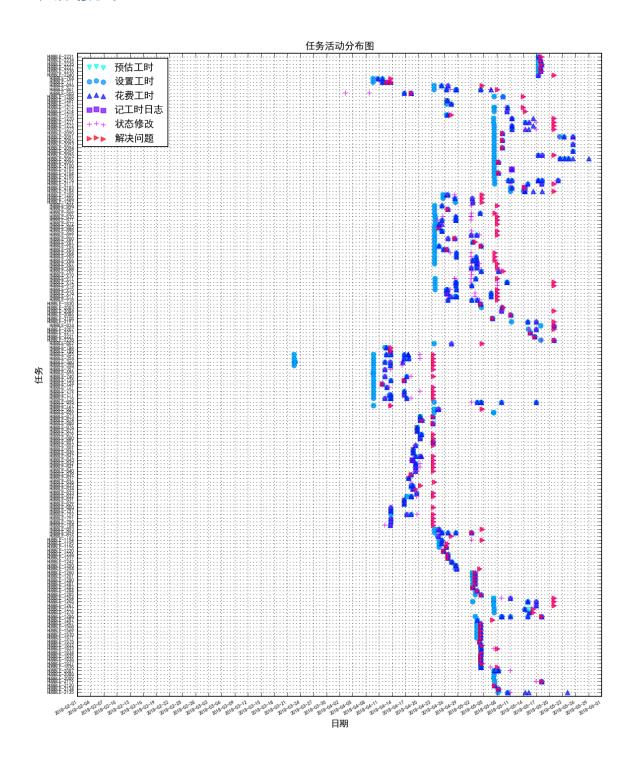

【图例说明】: 基于"时标"展示工作"活动"分布情况,如某任务状态迁移、时间更新等等。

### 二、任务执行状态

通过下图可直观了解在本里程碑内所有任务的当前执行情况。

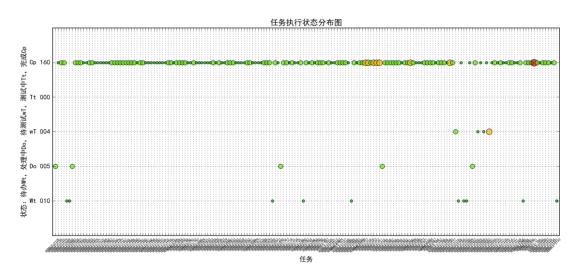


【图例说明】: 展示任务执行的状态分布情况。图中,圆点大小与任务被测试次数关联,圆点越小则间接表示 bug 数也越少。

出错率较高的任务有:

| Issue       | 任务                      | 返工次数 |
|-------------|-------------------------|------|
| HUBBLE-711  | 【正则表达式】插件包调试            | 3    |
| HUBBLE-916  | metagrid-api CD环境搭建     | 2    |
| HUBBLE-2091 | 结构化数据汇聚单个任务创建(前后端联调)    | 2    |
| HUBBLE-900  | one-log 模块容器化           | 2    |
| HUBBLE-917  | backend-service CD 环境搭建 | 2    |
| HUBBLE-913  | datasync 模块容器化          | 2    |
| HUBBLE-912  | dsmanager CD 环境搭建       | 2    |
| HUBBLE-911  | dsmanager 模块容器化         | 2    |
| HUBBLE-2183 | oracle/gp 数据源管理功能增强     | 2    |

#### 三、目标执行情况

通过下图可直观了解在本里程碑内所有目标(功能点)的当前执行情况。

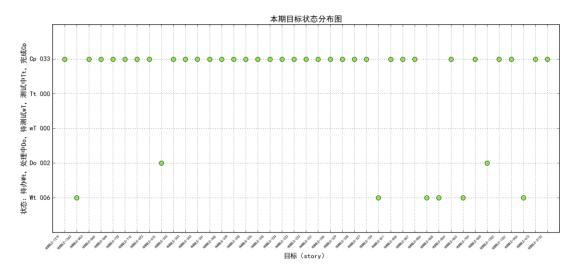


【图例说明】: 展示里程碑目标的状态分布情况。

#### 四、成本执行

- 计划预算总数: 408 【工时】
- 估计执行成本总数:822 【工时】
- 已执行成本总数:821 【工时】

通过下图可直观了解在本里程碑内所有目标(功能点)的预算执行情况。

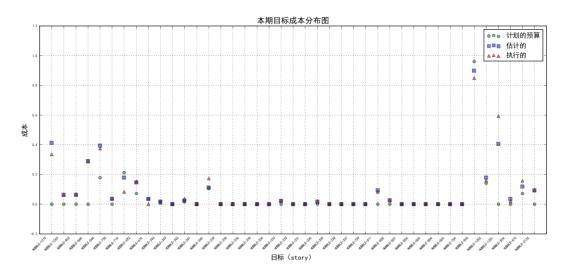

【图例说明】: 展示里程碑目标的预算执行情况。

### 五、任务执行情况


本里程碑的任务燃尽情况如下:

- 任务总数: 140
- 已完成的任务总数: 121
- 在测的任务总数: 0
- 待测的任务总数: 10
- 处理中的任务总数: 2
- 待办的任务总数: 7



【图例说明】:图中的红线为"理想"的任务燃尽趋势。

本阶段计划工时的燃尽情况:

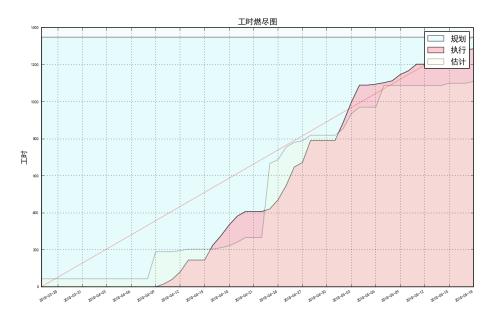

【图例说明】:图中的红线为"理想"的计划工时燃尽趋势。
